

Navigasjonskartet for prosjektøkonomi

Slik beskytter du forskningen, tiden
og midlene dine i BOA-prosjekter.

Praktisk opplæring for prosjektledere ved statlige universiteter og høyskoler

Økosystemet som sikrer prosjektet ditt

Faglig kraft (Prosjektleder)

Ansvarlig for fremdrift, faglig innhold og initiering av bestillinger. Du eier selve forskningen.

Økonomisk kompass (Controller)

Din rådgiver, analytiker og uavhengige kontrollør. Sikrer at prosjektet følger Statlige Regnskapsstandards (SRS) og budsjett.

Juridisk anker (Dekan / Instituttleder)

Innehar Budsjettdisponeringsmyndighet (BDM). Den eneste som kan binde institusjonen juridisk utad. Beskytter deg mot personlig og institusjonelt ansvar.

Funksjonsskillet (Bestemmelsene pkt. 2.5.2): Den som bestiller (BDM) og den som godkjenner (Attestasjon) kan aldri være samme person. Dette er et absolutt krav i staten for å forebygge feil.

Prosjektets økonomiske livssyklus

1. Pre-award (Søknad)

Kalkulering og TDI-modellen.
Å prise ekspedisjonen riktig.

2. Post-award (Opprettelse)

Klassifisering etter SRS 9 og
10. Oppdrag versus bidrag.

3. Gjennomføring (Drift)

Timeregistrering, attestasjon
og pulssjekker for avvik.

4. Prosjektslutt (Avslutning)

Sluttavregning og håndtering
av potensielle underskudd.

TDI-kalkylen: Det synlige og det usynlige

Direkte kostnader (Det synlige)

- Forskerlønn og frikjøp
- Spesifikt laboratoriemateriell
- Prosjektutstyr og reiser



Indirekte kostnader / Overhead (Det usynlige)

- Kontorplass og bygningsdrift
- IKT-systemer og lisenser
- HR, lønnskjøring og bibliotekstjenester

Hvorfor UHRs Totalkostnadsmodell (TDI)?

Uten dekning for det usynlige fundamentet, vil eksterne prosjekter gradvis tappe instituttets interne grunnbevilgninger. TDI sikrer at vi ikke subsidierer eksterne finansierer.

Det regnskapsmessige skillet: Bidrag eller Oppdrag?

SRS 10: Bidragsforskning

 **Kilde:** NFR, EU Horizon, Stiftelser.

 **Krav:** Ingen direkte kommersiell motytelse eller overføring av rettigheter.

 **Prinsipp:** Motsatt sammenstilling. Inntekt føres kun i takt med at kostnadene faktisk påløper.

 **Bunnlinje:** Ubrukte midler/forskudd går til balansen som kortsiktig gjeld (ikke inntekt).

SRS 9: Oppdragsforskning

 **Kilde:** Næringsliv, Statlige etater.

 **Krav:** Direkte krav om konkret motytelse, leveranse eller rettighet.

 **Prinsipp:** Løpende avregning. Krav om full kostnadsdekning (inkludert all overhead) og ev. fortjenestemargin.

 **Bunnlinje:** Eventuelt overskudd tilfaller institusjonen.

Formelen bak din tid

Hvorfor akkurat 215?

365 dager i året minus helger, lovfestet ferie og helligdager. Dette er det eksakte antallet produktive dager vi har.



Maksimal grense

Timekonvertering krever at timer ikke settes lavere enn **90 %** av en **fulltidsansatts årsverk**.

Årslønn



215 dager



Din prosjektsats
per dag

Hvordan brukes dette?

NFR og EU (Horizon Europe) refunderer institusjonen basert på denne brøken, multiplisert med de faktiske timene du registrerer.



Tidslekkasjen: Hvorfor vi krever løpende timeregistrering



Manglende timer = Manglende fakturering.

Hvis du jobber på prosjektet uten å føre timer, jobber du i praksis gratis for EU eller NFR.



Revisjonsstryk.

Etterkontroller fra Riksrevisjonen og EUs revisorer underkjenner estimer og grove anslag. De krever systematiske, attesterte timer.




Resultatet

Mangelfull arkivering eller tidsføring (R4 Risiko) fører direkte til tap av inntekter og krav om tilbakebetaling.

Vi maser ikke om timer fordi vi elsker mikrostyring. Vi gjør det fordi forskningsmidlene dine renner ut i vasken uten dem.

Hva betyr din signatur? (Attestasjon i praksis)


Før økonomisystemet utbetaler en krone, må utgiften attesteres. Som prosjektleder bekrefter du følgende fire punkter:

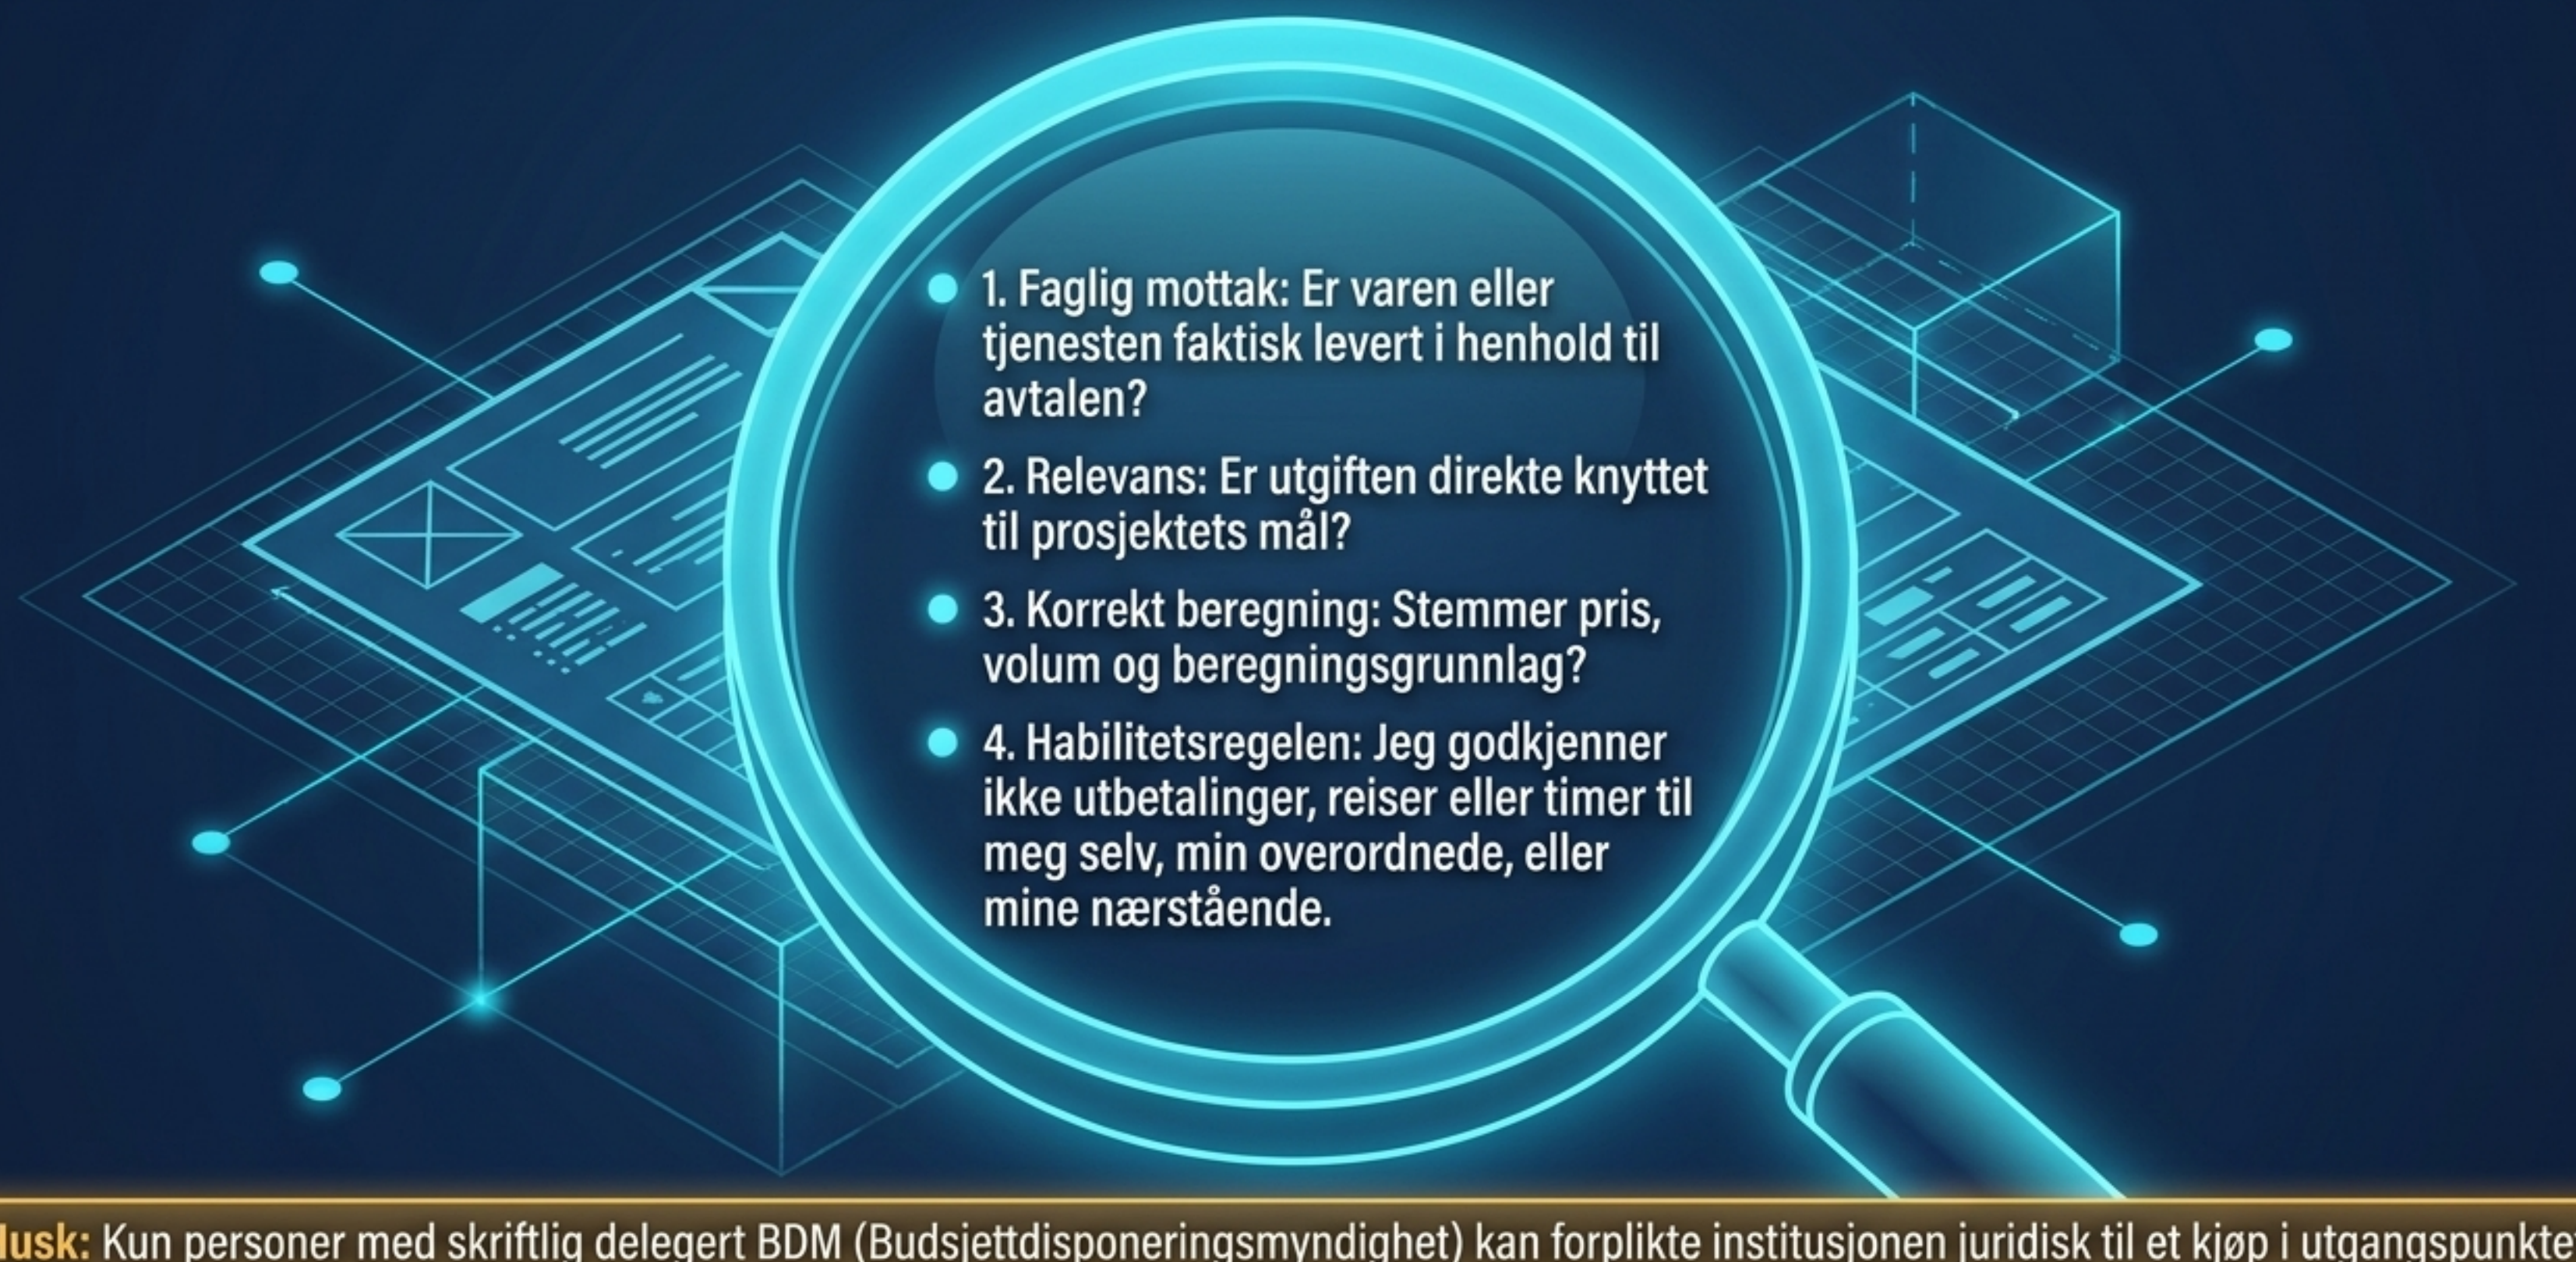- 
- 1. Faglig mottak: Er varen eller tjenesten faktisk levert i henhold til avtalen?
 - 2. Relevans: Er utgiften direkte knyttet til prosjektets mål?
 - 3. Korrekt beregning: Stemmer pris, volum og beregningsgrunnlag?
 - 4. Habilitetsregelen: Jeg godkjenner ikke utbetalinger, reiser eller timer til meg selv, min overordnede, eller mine nærstående.

Husk: Kun personer med skriftlig delegert BDM (Budsjettdisponeringsmyndighet) kan forplikte institusjonen juridisk til et kjøp i utgangspunktet.

Når vi styrer skuta: Koordinatorrollen

Når vi leder store konsortier (f.eks. EU Horizon), feirer vi ofte enorme tildelinger. Men store deler av disse midlene er kun på gjennomreise.

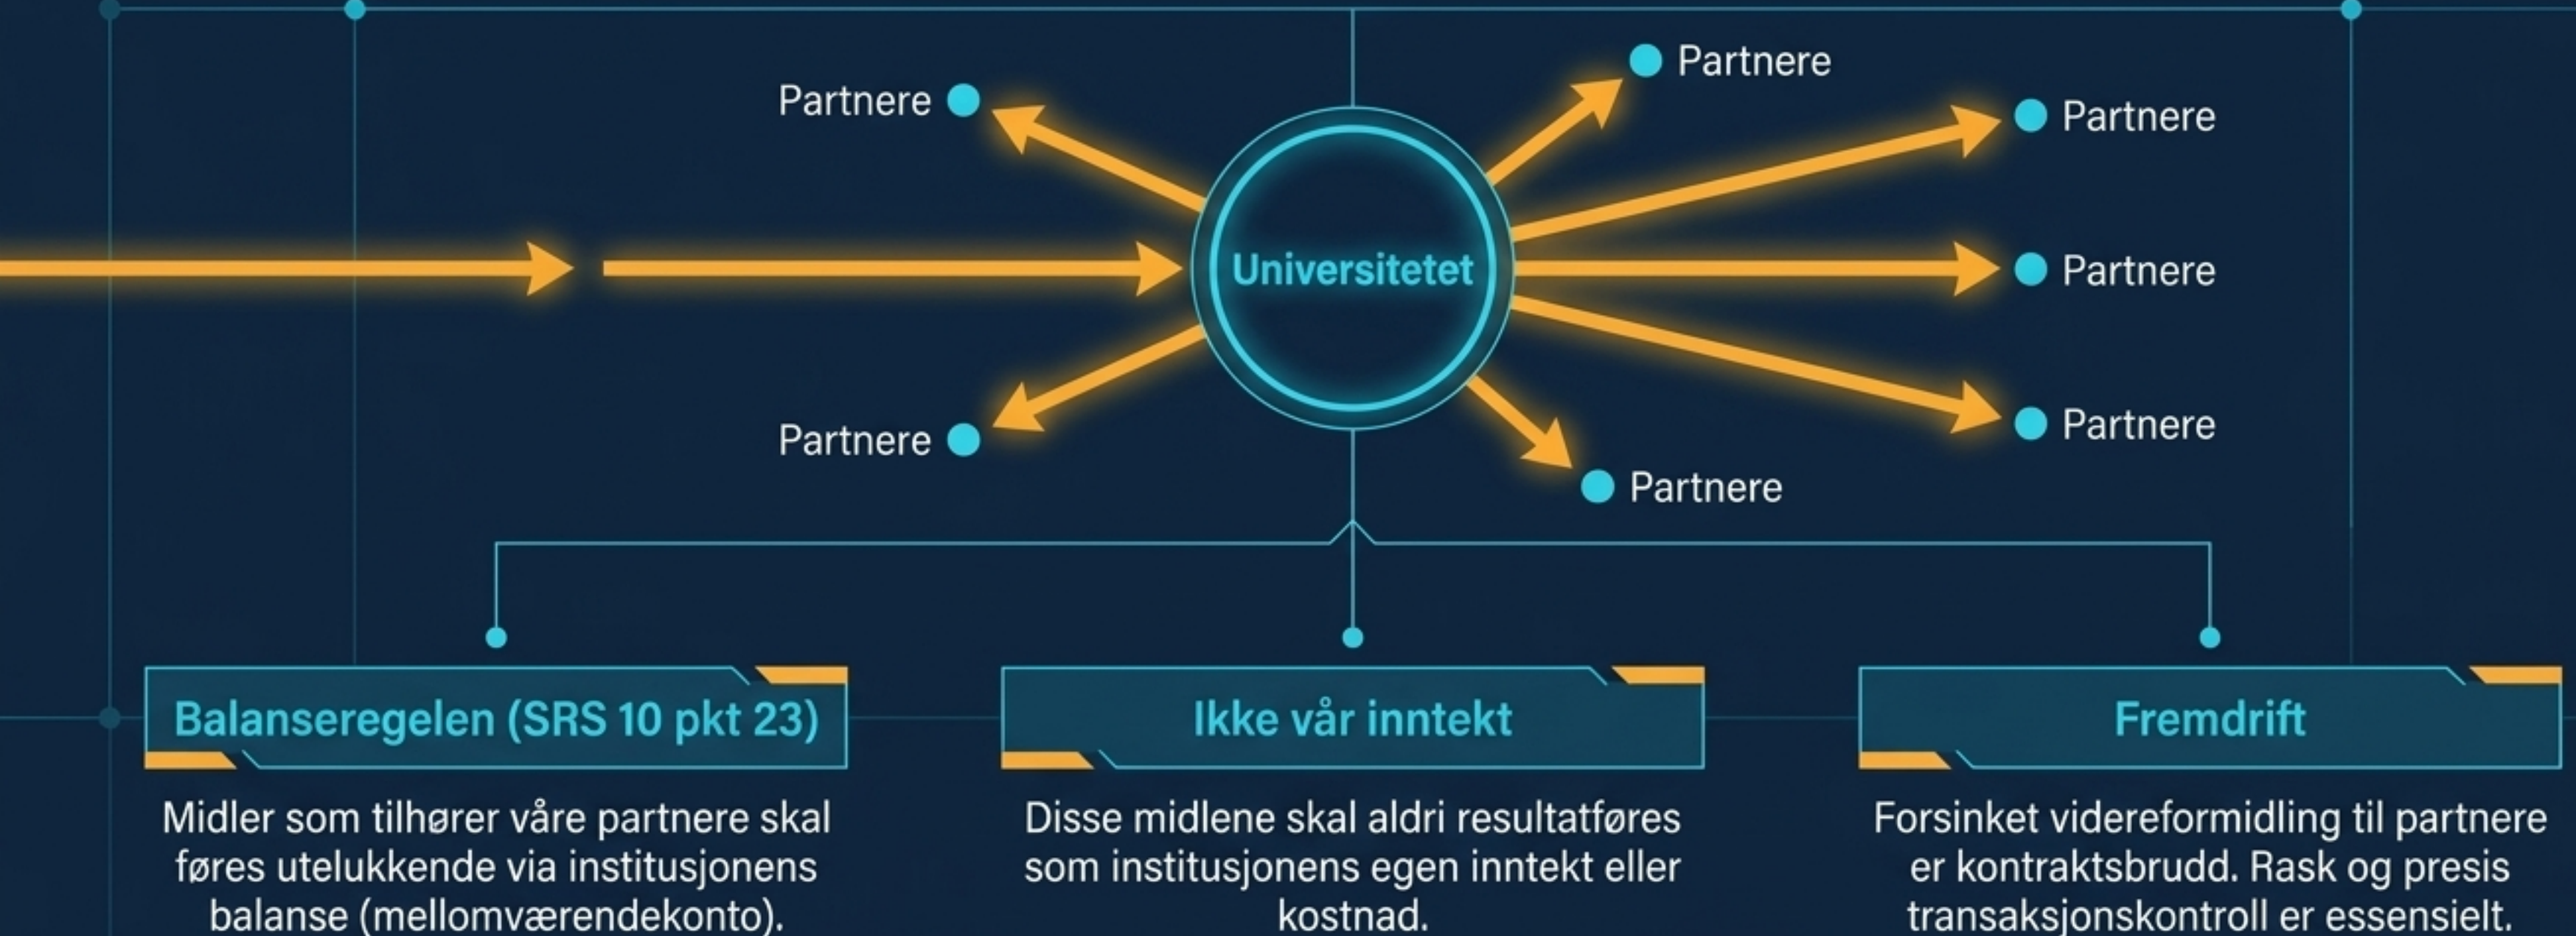


Pulssjekken: Månedlig avviksanalyse

Hvorfor møtes vi?

Det månedlige/tertiarvise møtet med din controller sammenligner periodisert budsjett mot faktisk regnskap.

Vi ser etter to typer avvik:

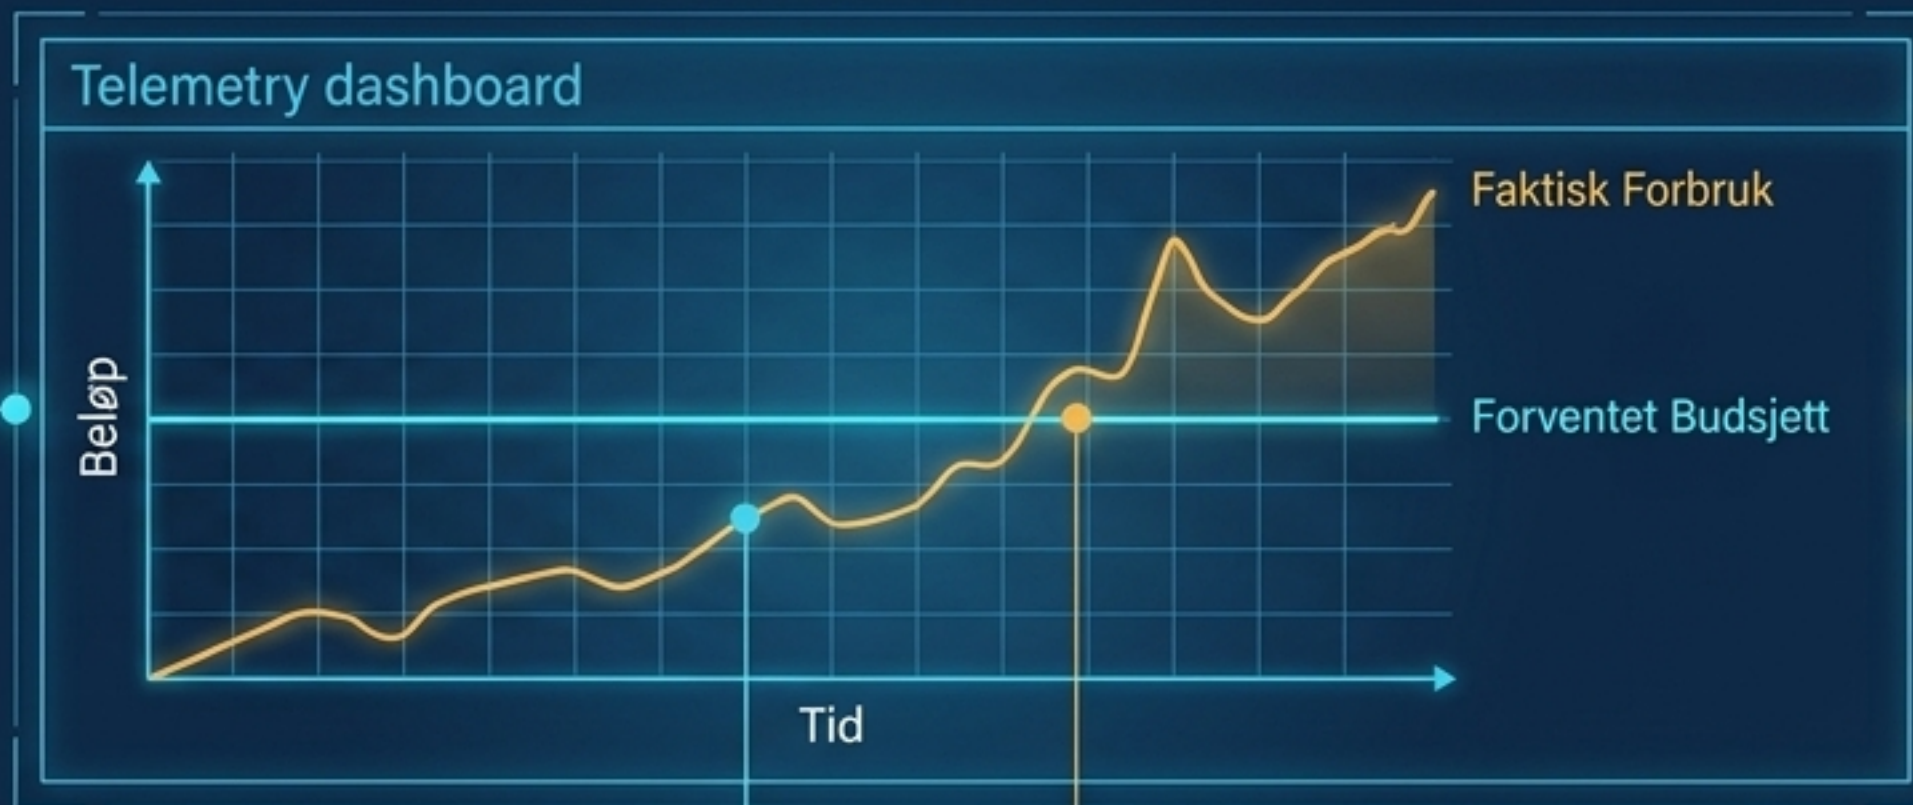

Tids- og fremdriftsavvik (Periodisering):

Eks: Ansettelsen av postdoken er tre måneder forsinket. Midlene forskyves, og vi må justere fart eller søke forlengelse.



Reelle kostnadsavvik (Varige):

Eks: Feltarbeidet, valutaendringer eller laboratorieutstyr ble dyrere enn kalkylen. Dette spiser varig av prosjektrammen.

Risikomatrisen for BOA: Våre tre største trusler



Mot slutten av reisen: Tapsavsetning

Hva skjer når pulssjekken viser at prosjektet uunngåelig styrer mot et underskudd?



Regelen om umiddelbar handling (Konto 786)

Avsetning for forventet tap skal foretas **umiddelbart** når underskuddet oppdages, uansett om prosjektet er ferdig eller ikke. **Det er ikke tillatt å "feie underskuddet under teppet" til desember eller prosjektslutt.**

- Sluttrapportering og innkreving av fordringer.
- Korrekt regnskapsmessig håndtering av ubenyttede midler (tilbakebetaling for Bidrag, institusjonsgevinst for Oppdrag).

Sjekklisten for suksess

- ☒ **Kalkyle:** Godkjent **TDI-kalkyle** før signatur (**BDM innhentet**).
- ☒ **Oppsett:** Prosjektet er korrekt klassifisert (**Oppdrag SRS 9** vs. **Bidrag SRS 10**).
- ☒ **Tid:** Timer føres kontinuerlig (**215-dagersregelen** er **aktiv**).
- ☒ **Kontroll:** Mottak kontrolleres faglig og **habilitet bekreftes** ved attestasjon.
- ☒ **Radar:** **Avvik og potensielle tap** meldes **umiddelbart** i statusmøter med **controller**.

Målet med disse rutinene er ikke mer byråkrati, men å rydde veien for det du egentlig er her for: **Forskningen**. Din prosjektcontroller er klar til å hjelpe.
